

Opis projekta

ecom




SimulTrain

Opis projekta

Ime projekta	e-com
procijenjeno trajanje	11 tjedana
Kontrolne točke (milestones)	1. odobrenje specifikacija 2. prototip softvera spreman 3. testiranje završeno 4. Deployment completed
Tim	- Suzi, Fran i Tomo - drugi ljudi po potrebi
Opis	U skladu s marketinškom strategijom definiranom na početku godine, uprava je odlučila našim kupcima ponuditi on-line interaktivnu uslugu. To će kupcima omogućiti da prate svoje narudžbe, a da se ne moraju obraćati službi za korisnike ili računovodstvu. Za ovaj projekt izrađen je preliminarni raspored s popisom aktivnosti, budžetom i potrebnim vremenom. Uspostavljen je uži projektni tim.


Organizacijska shema

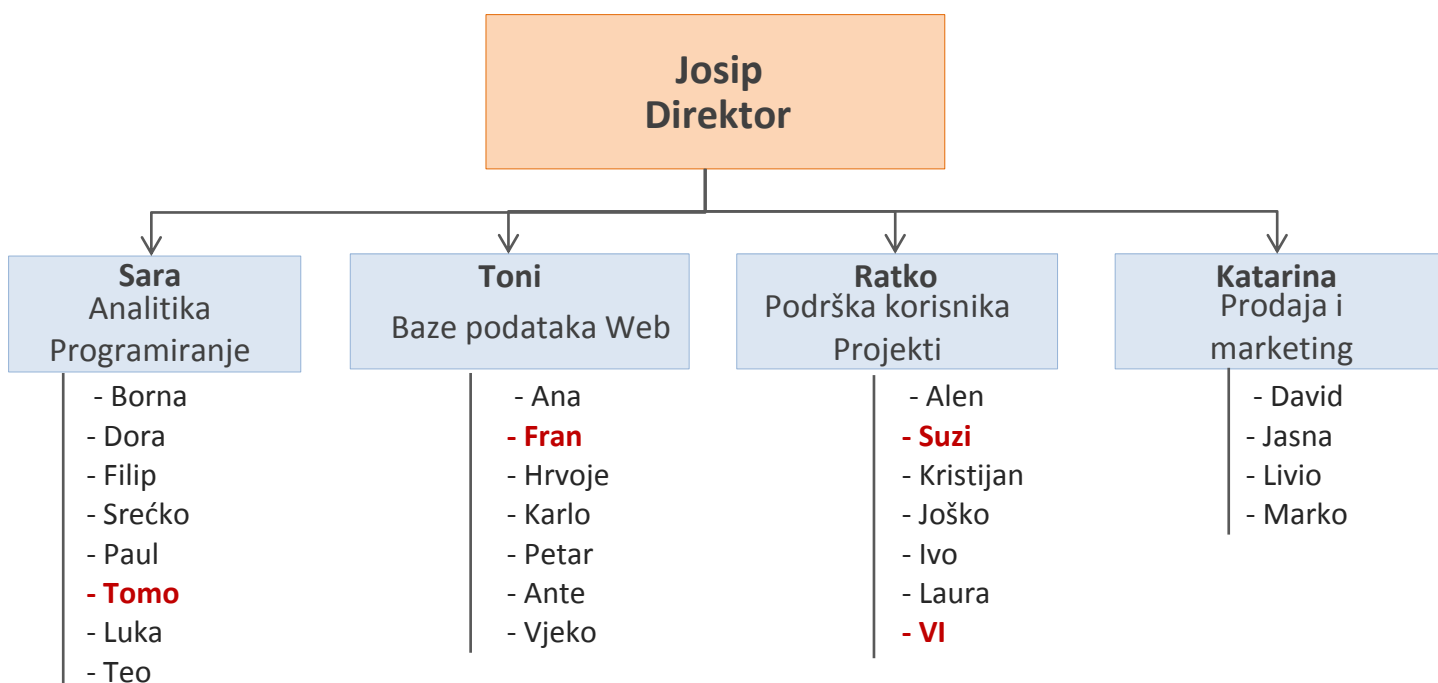

	Aktivnosti na projektu	Broj zaposlenih	Procjenjeno trajanje (dana)	Ovisi o prethodnim aktivnostima	Potrebne vještine				
					Web dizajn	Baze podataka	Programiranje	Poslovanje	Prodaja i mktg
1	Specifikacije	2	5	—	2			5	3
2	Korisničko sučelje	1	7	1	5			2	
3	Koncept e-plaćanja	2	10	1	3	1		4	3
4	Dizajn baze podataka	2	12	1	1	6	3		
5	Prototip softvera	2	8	3, 4	4	3	4		
6	Administrativni alati	2	13	2, 5	1	2	4	3	
7	Testovi korištenja	4	15	5	2	1		2	
8	Online help	3	14	5	1		3	2	
9	Sučelje za unos	3	5	4	2	5	2		
10	Unos podataka	1	10	6, 9		3		2	
11	Marketinški plan	2	11	1				4	6
12	IT razvoj	3	6	5	3	3	5		
13	Određivanje cijena	4	11	11				3	5
14	Funkcionalni testovi	1	5	7, 12, 13	1		3		
15	Aplikativni testovi	3	3	8, 10, 14	2		1	2	
16	Dokumentacija	1	22	2	3	1	3	2	
17	Početak rada	4	2	15, 16	1		4	3	

Tabela resursa	Satnica	Raspoloživost na projektu	Na raspolaganju od tjedna	Vještine				
				Web dizajn	Baze podataka	Programiranje	Poslovanje	Prodaja i mktg
Alen	86	100%	4	3	1	2	2	
Ana	160	100%	2	6	5	6	3	
Borna	102	100%	4	3	2	4		2
Dora	87	80%	3	2	3	3		
Filip	89	100%	6	1		4		1
Fran	89	90%	1	2	4	2		
Hrvoje	135	80%	2	6	3	5	2	
Ivo	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luka	70	70%	3	2		4		
Marko	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Petar	128	80%	2	6	4	4	1	
Suzi	151	80%	1	5	3	4	5	3
Teo	58	100%	3	3		3		
Tomo	97	100%	1	2		4	3	

Mrežni dijagram

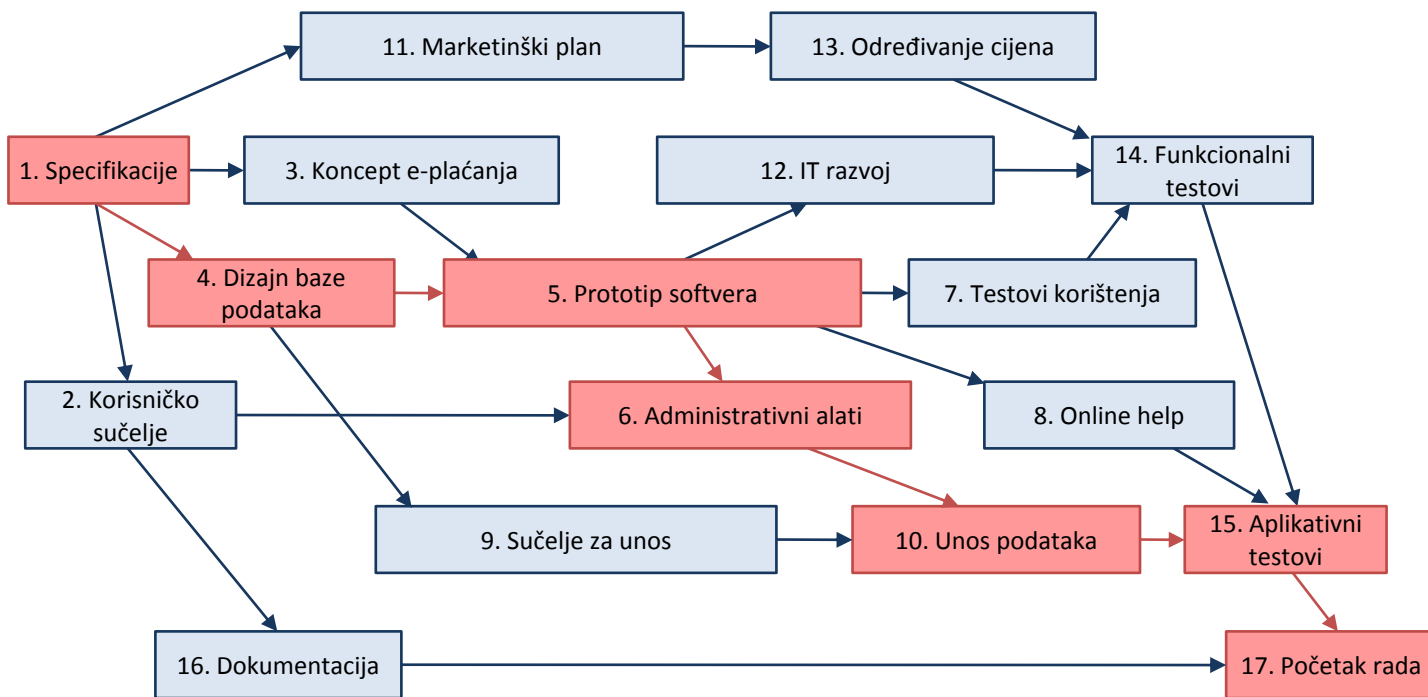

Ganttogram

