

# 项目描述

e-com




**SIMULTRAIN**

# 项目描述

项目名称	<b>e-com</b>
预计所用时间	<b>11 周</b>
里程碑	1. 规定说明已确认 2. 软件原型已备好 3. 测试完成
团队	- Sue, Fred et Tim - 所需时其他成员
描述	根据今年年初制定的市场战略,管理层打算为客户提供在线互动服务系统。顾客无需客服部或财务部的介入即可实施定购操作并跟踪后续服务。 我们已制定了试验性的要求细则,任务列表,预算,时间期限并组建起核心团队。


# 组织机构图表

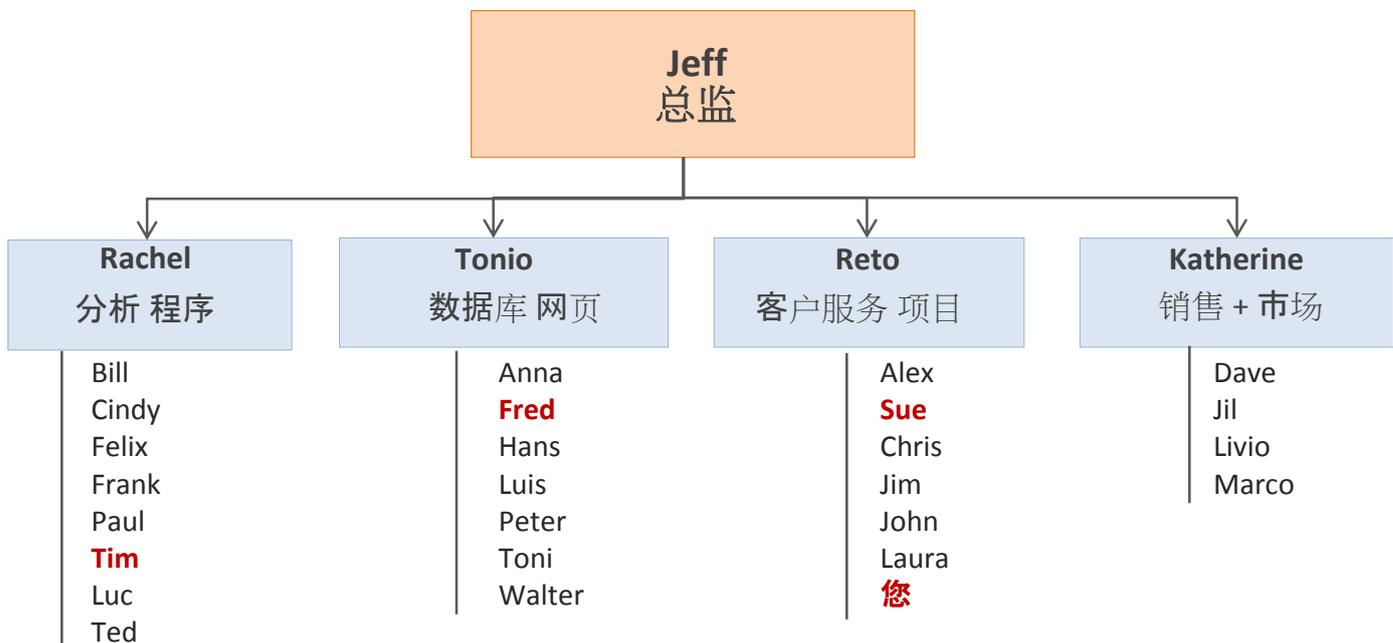

项目任务	预期的人员数	预计持续时间 (日)	基于之前的任 务	技能要求				
				网页设计	数据库	程序	业务	销售 + 市场
1 规定	2	5	—	2			5	3
2 用户界面	1	7	1	5			2	
3 网上支付概念	2	10	1	3	1		4	3
4 基础数据建构	2	12	1	1	6	3		
5 软件样本	2	8	3, 4	4	3	4		
6 管理工具	2	13	2, 5	1	2	4	3	
7 绩效测试	4	15	5	2	1		2	
8 在线帮助	3	14	5	1		3	2	
9 输入界面	3	5	4	2	5	2		
10 数据输入	1	10	6, 9		3		2	
11 市场计划	2	11	1				4	6
12 信息技术开发	3	6	5	3	3	5		
13 价格确定	4	11	11				3	5
14 功能测试	1	5	7, 12, 13	1		3		
15 应用测试	3	3	8, 10, 14	2		1	2	
16 文档	1	22	2	3	1	3	2	
17 执行	4	2	15, 16	1		4	3	

资源	每小时比率	项目可行性	从第...周开始 可行	技能资质				
				网页设计	数据库	程序	业务	销售 + 市场
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

# 逻辑网络图表

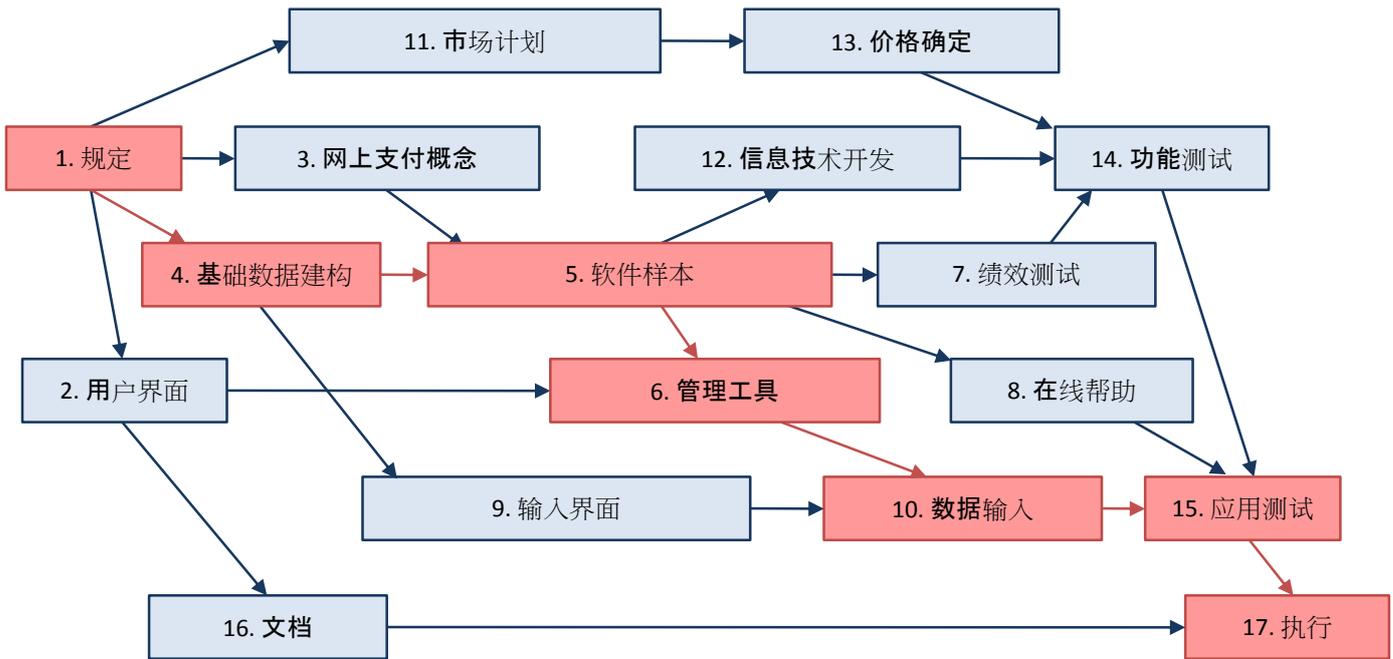

# Gantt图表

