


Popis projektu

ecom




SimulTrain

Popis projektu

Název projektu	e-com
Odhadované časové rozpětí	11 týdnů
Mezníky	<ol style="list-style-type: none">1. Schválení požadavků2. Příprava softwarového modelu3. Testy4. Deployment
Tým	<ul style="list-style-type: none">– Zuzana, František a Robert– Další lidé podle potřeby
Popis	V souladu s marketingovou strategií definovanou na začátku roku, požaduje management zajištění interaktivní online služby svým zákazníkům. Ta umožní zákazníkům sledování a kontrolu objednávek bez účasti zákaznického servisu nebo účtárny. Pro tento projekt byl sestaven prozatímní plán se seznamem aktivit, rozpočtem a požadovanou časovou dotací. Byl ustanoven hlavní tým.


Organizační schéma

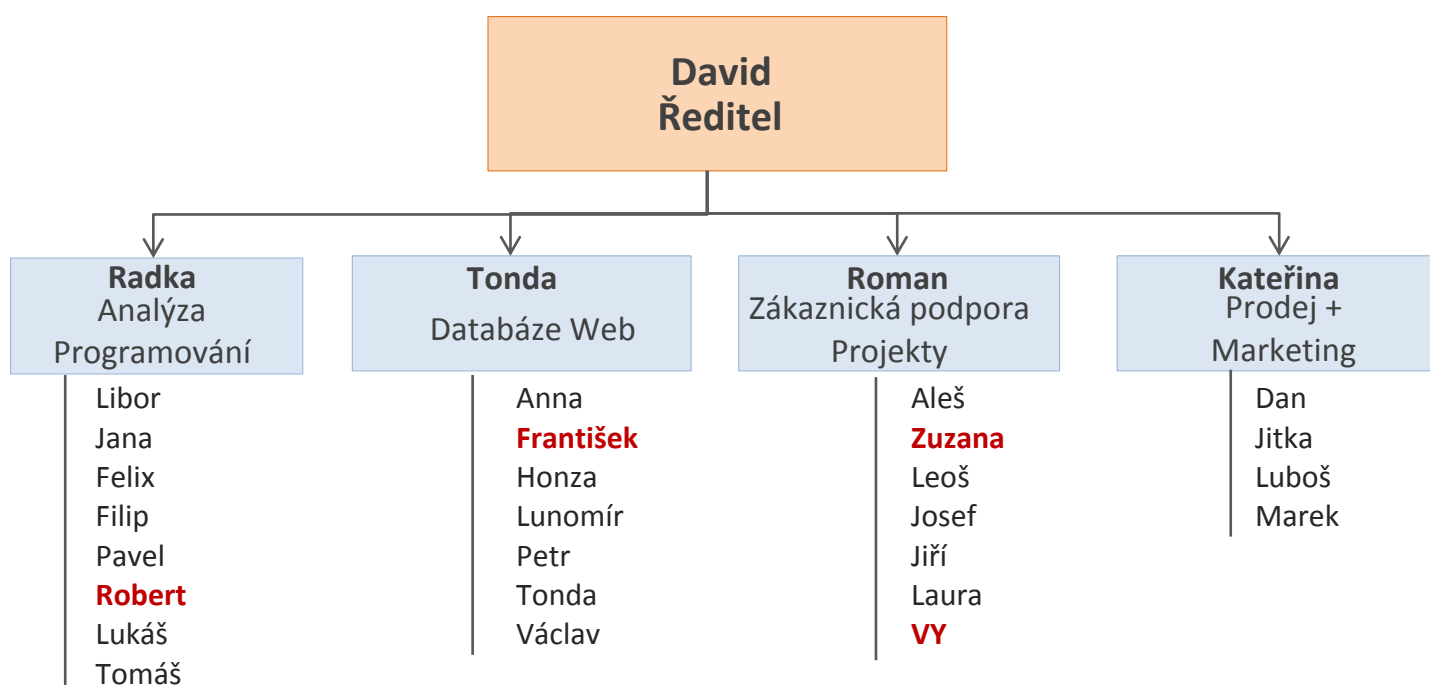

	Činnosti projektu	Množství lidí	Odhadovaná délka (dny)	Záleží na předchozích činnostech	Požadované schopnosti				
					Tvorba webu	Database	Programování	Obchodní činnost	Objem prodeje + mkg
1	Funkční specifikace	2	5	—	2			5	3
2	Uživatelské rozhraní	1	7	1	5			2	
3	Koncepce ePayment	2	10	1	3	1		4	3
4	Návrh databáze	2	12	1	1	6	3		
5	Softwarový model	2	8	3, 4	4	3	4		
6	Administrativní nástroje	2	13	2, 5	1	2	4	3	
7	Implementační testy	4	15	5	2	1		2	
8	Online nápověda	3	14	5	1		3	2	
9	Import rozhraní	3	5	4	2	5	2		
10	Import dat	1	10	6, 9		3		2	
11	Marketingový plán	2	11	1				4	6
12	Vývoj softwaru	3	6	5	3	3	5		
13	Stanovení cen	4	11	11				3	5
14	Funkční testy	1	5	7, 12, 13	1		3		
15	Aplikační testy	3	3	8, 10, 14	2		1	2	
16	Dokumentace	1	22	2	3	1	3	2	
17	Ostré spuštění	4	2	15, 16	1		4	3	

Tabulka lidských zdrojů	Hodinová sazba	Dostupnost pro projekt, %	Dostupný od týdne	Dovednosti				
				Tvorba webu	Database	Programování	Obchodní činnost	Objem prodeje + mkg
Aleš	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Libor	102	100%	4	3	2	4		2
Jana	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
František	89	90%	1	2	4	2		
Honza	135	80%	2	6	3	5	2	
Jiří	125	100%	3	4	6	5		
Luboš	97	100%	2	1	1		4	6
Lukáš	70	70%	3	2		4		
Marek	89	100%	3	1			5	5
Pavel	175	100%	4	5	5	6	3	1
Petr	128	80%	2	6	4	4	1	
Zuzana	151	80%	1	5	3	4	5	3
Tomáš	58	100%	3	3		3		
Robert	97	100%	1	2		4	3	

Schéma činností

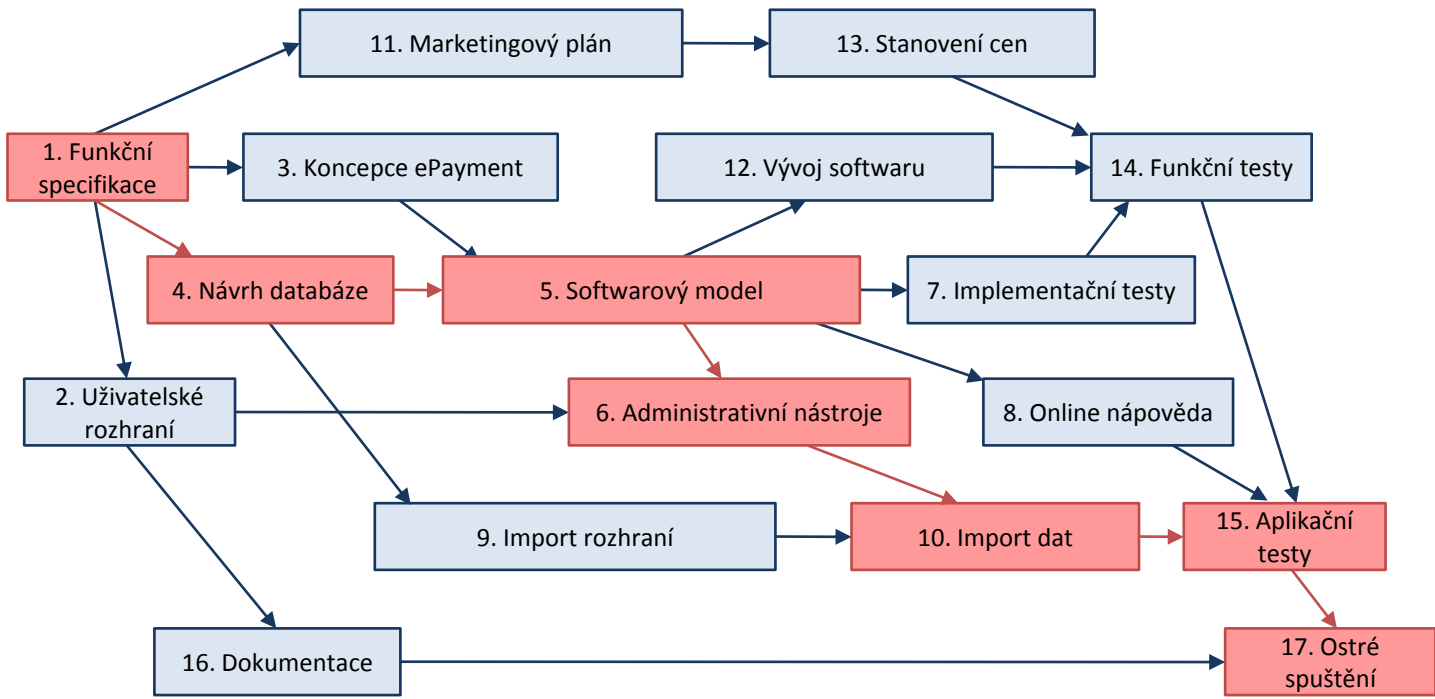

Ganttův diagram

