

Projektbeskrivelse

ecom




SimulTrain

Projektbeskrivelse

Projekt navn	e-com
Estimeret varighed	11 uger.
Milepæle	<ol style="list-style-type: none">1. Specifikationer godkendt.2. Software prototype klarmeldt.3. Tests gennemført og godkendt4. Deployment completed
projektgruppe	Sue, Fred og Tim. – Øvrige person ressourcer efter behov
Beskrivelse	I henhold til den marketing strategi der blev besluttet i begyndelsen af året, så ønsker ledelsen at give vores kunder online adgang til et interaktivt system. Det vil gøre det muligt for kunderne at kontrollere og følge op på ordrer uden involvering af kundeservice eller regnskabsafdeling. Der foreligger en foreløbig tidsplan med aktiviteter og budget. Kerne projektgruppen er etableret.


Organisationsplan

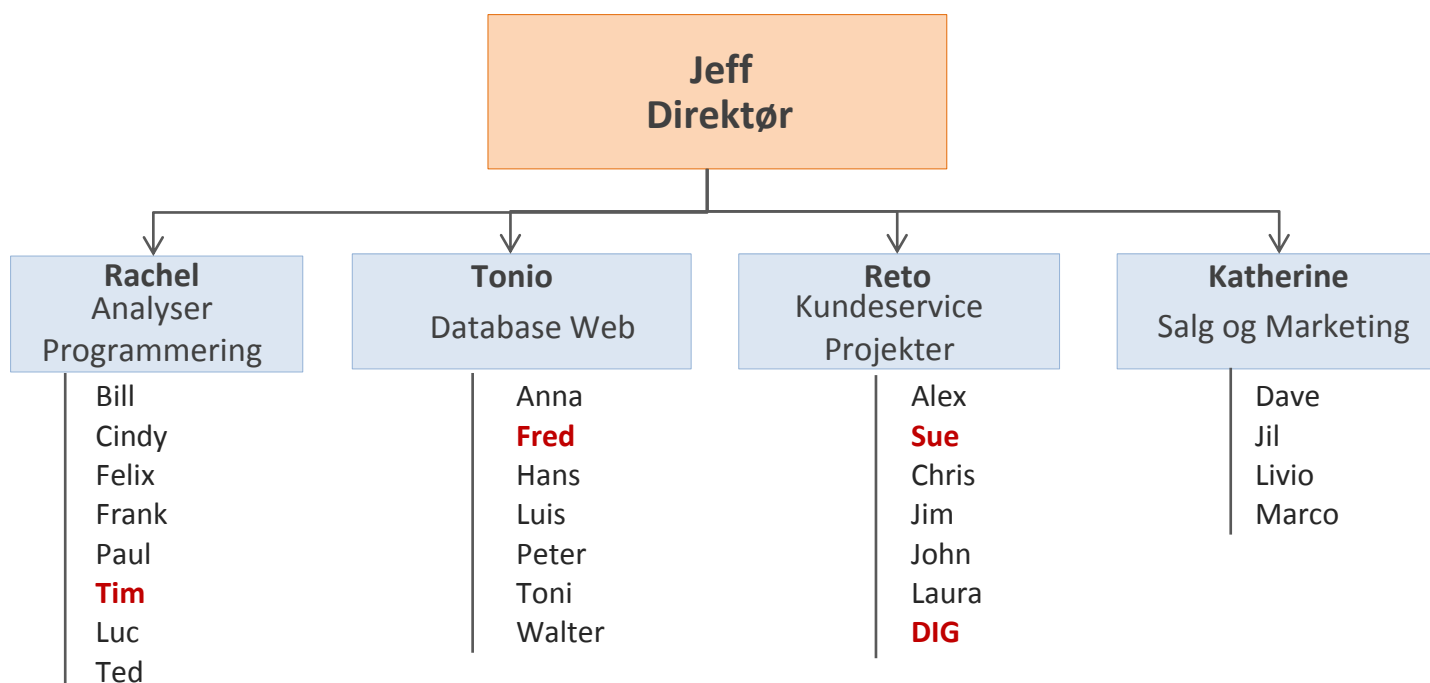

	Projektaktiviteter	Antal medarbejdere	Estimeret varighed (dage)	Afhænger af de forrige aktiviteter	Krævede faglige kompetencer				
					Web design	Database	Programmering	Business	Salg + Marketing
1	Specifikationer	2	5	—	2			5	3
2	Bruger interface	1	7	1	5			2	
3	eBetalings koncept	2	10	1	3	1		4	3
4	Database design	2	12	1	1	6	3		
5	Software prototype	2	8	3, 4	4	3	4		
6	Administrative værktøjer	2	13	2, 5	1	2	4	3	
7	Brugertest	4	15	5	2	1		2	
8	Online hjælp	3	14	5	1		3	2	
9	Import interface	3	5	4	2	5	2		
10	Data import	1	10	6, 9		3		2	
11	Marketingplan	2	11	1				4	6
12	IT udvikling	3	6	5	3	3	5		
13	Fastsættelse af priser	4	11	11				3	5
14	Funktionstest	1	5	7, 12, 13	1		3		
15	Applikationstest	3	3	8, 10, 14	2		1	2	
16	Dokumentation	1	22	2	3	1	3	2	
17	Idriftsættelse	4	2	15, 16	1		4	3	

Ressourceoversigt	Timesats	Til rådighed for projektet, %	Til rådighed fra uge	Faglig kompetence				
				Web design	Database	Programmering	Business	Salg + Marketing
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

Aktivitets netværk

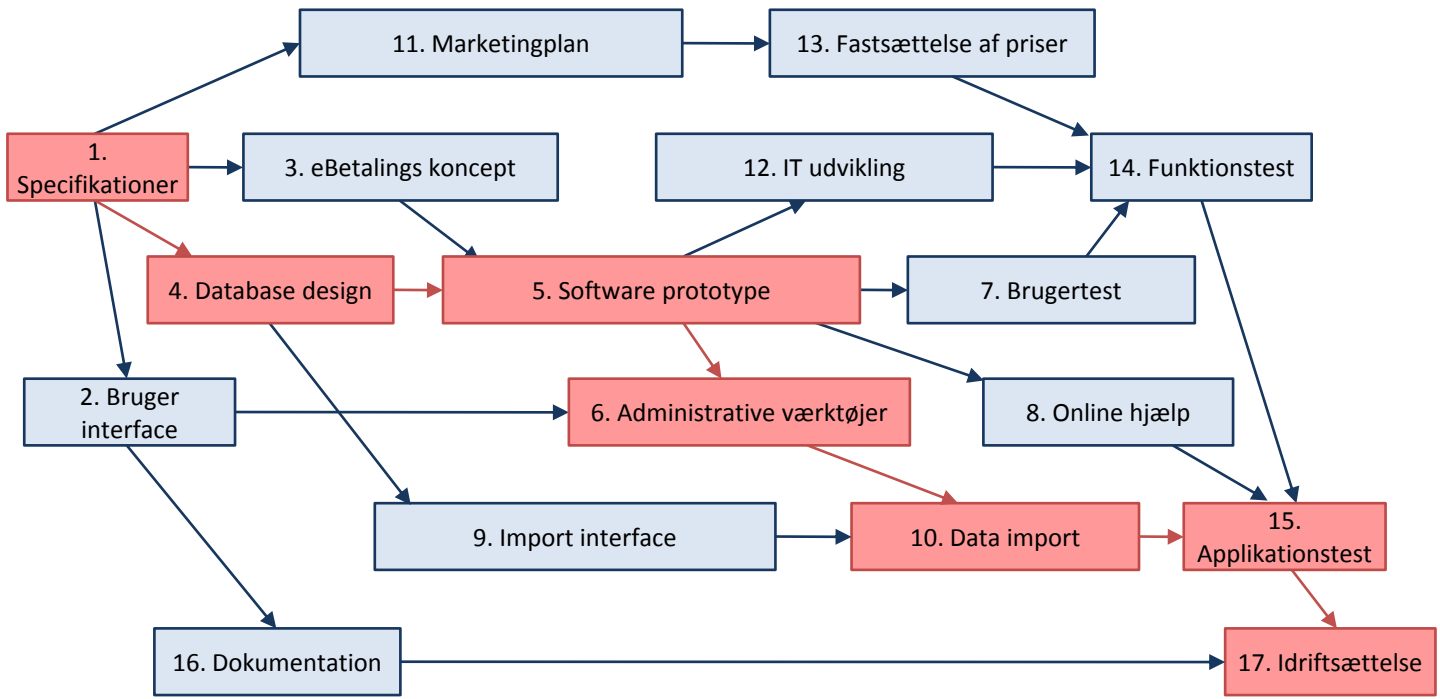

Gantt diagram

