

Descrizione del progetto

reorg




SimulTrain

Descrizione del progetto

Nome del progetto	Riorganizzazione aziendale
Durata stimata	11 settimane
Scadenze	<ul style="list-style-type: none">– Approvazione del Management– Revisione MbO– Implementazione della soluzione- Report al Management
Team	<ul style="list-style-type: none">– Sue, Fred e Tim– Altri collaboratori a secondo dei bisogni.
Profilo	Conformemente alla nuova strategia aziendale definita all'inizio dell'anno, la direzione vuole adattare l'organizzazione in modo da meglio rispondere alle nuove sfide del mercato. Con nuove misure si miglioreranno sia la capacità di rispondere alle richieste del cliente in modo migliore e più velocemente, sia l'efficienza del network globale dei partner. Per questo progetto è stata redatta una lista delle attività da svolgere, e una stima dei tempi e dei costi (budget). È stato inoltre anche nominato il Core Team (cioè i collaboratori dedicati esclusivamente al progetto)

Organigramma

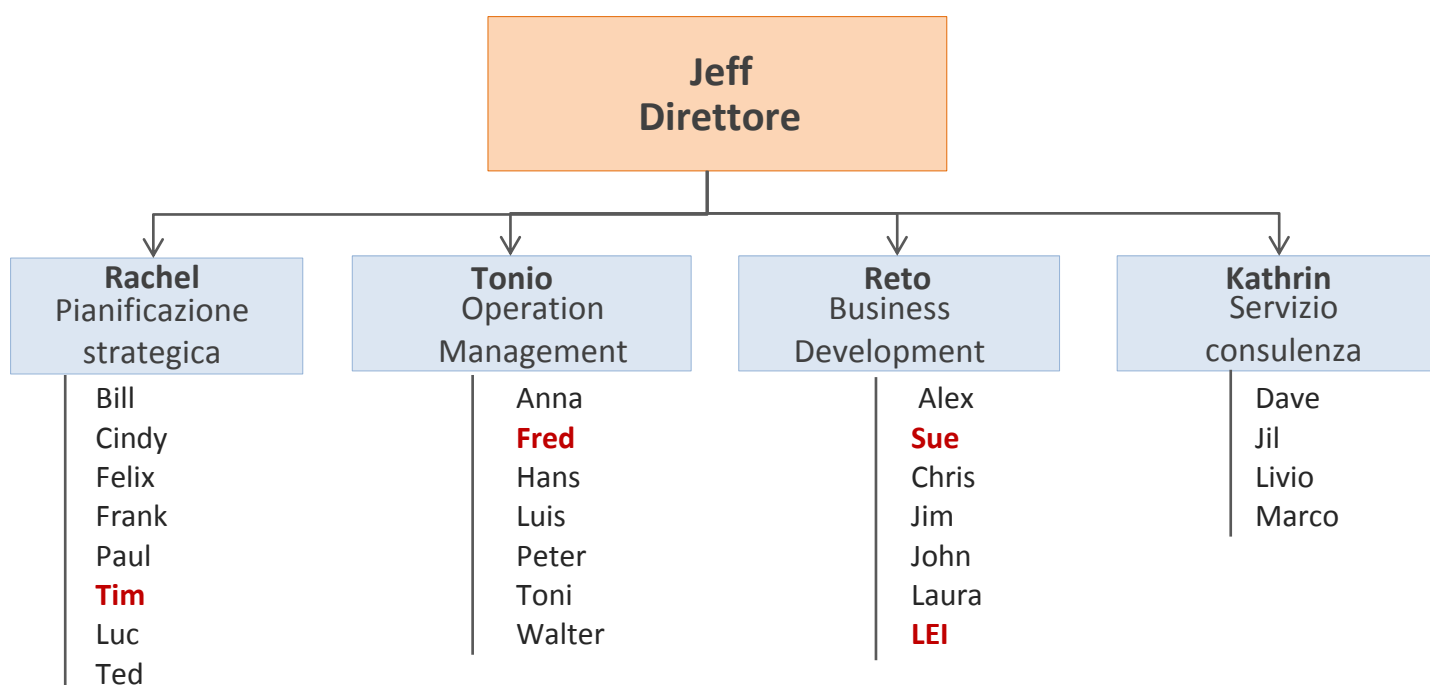

	Attività del progetto	Numero di persone	Durata prevista (giorni)	Dipende dalle attività precedenti	Qualifiche necessarie				
					Project Management	Risorse umane	Operation Management	Comunicazione e PR	Accounting services
1	Definire la strategia	2	5	—	3	2	2	3	
2	Schema normativo RU	1	7	1		5	1	3	1
3	Linee guida dettagliate	2	10	1	4		2	3	2
4	Condividere la visione	2	12	1	3	3		5	
5	Sviluppare la soluzione	2	8	3, 4	4		4	2	2
6	Approvazione del Management	2	13	2, 5	4	1		4	
7	Informazione interna	4	15	5	3	1	1	5	2
8	Revisione del MbO	3	14	5	3	1	2	3	
9	Matrice delle responsabilità	3	5	4	3	4	2	2	
10	Implementare la soluzione	1	10	6, 9	2	1	4	3	1
11	Gestione Stakeholder	2	11	1	3	2		4	3
12	Infrastruttura	3	6	5	2		3	3	4
13	Informazione esterna	4	11	11	3			5	3
14	Rilocalizzazione	1	5	7, 12, 13			1	2	4
15	Gestire la resistenza	3	3	8, 10, 14		2	4	3	1
16	Documentazione	1	22	2	4	2	3	2	1
17	Report al management	4	2	15, 16	3		2	4	2

Tavola delle risorse	Costo orario	Disponibilità per il progetto	Disponibile dalla settimana	Qualifiche				
				Project Management	Risorse umane	Operation Management	Comunicazione e PR	Accounting services
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

Piano reticolare

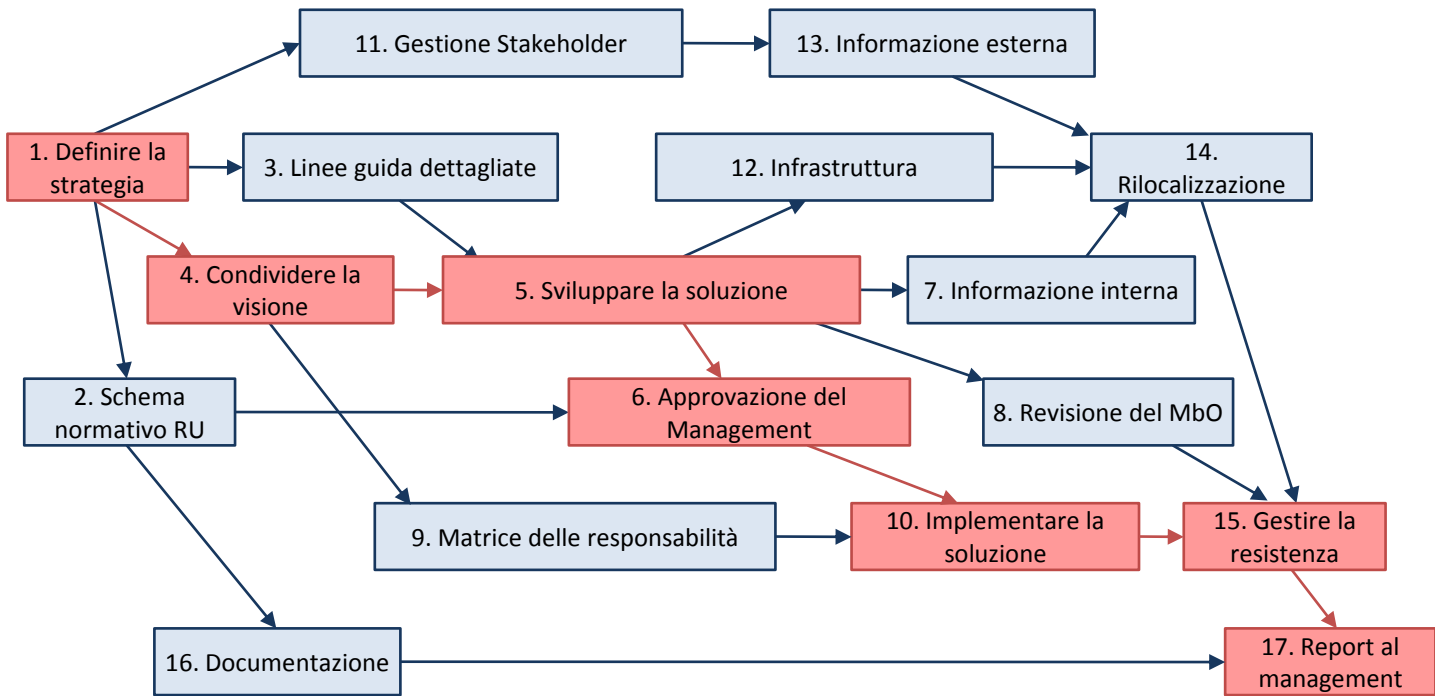


Diagramma di Gantt

