

项目描述

Oil & Gas




SimulTrain

项目描述

项目名称	炼油厂改装准备
预计持续时间	1周
里程碑	1.规范起草 2.签订合同 3.专业完成 4.生产计划批准
团队	-Sue, Fre and Time -若有所需的其他成员
描述	您的公司拥有几家炼油厂。公司管理层希望迅速对高品质汽油不断增长的需求做出回应。需购买和安装附加设备。现已规划启动此新安装项目的子项目。对于这个分项目，已经制定了暂行时间表，列出了所需活动、预算和时间。也已确定核心团队。


组织机构图表

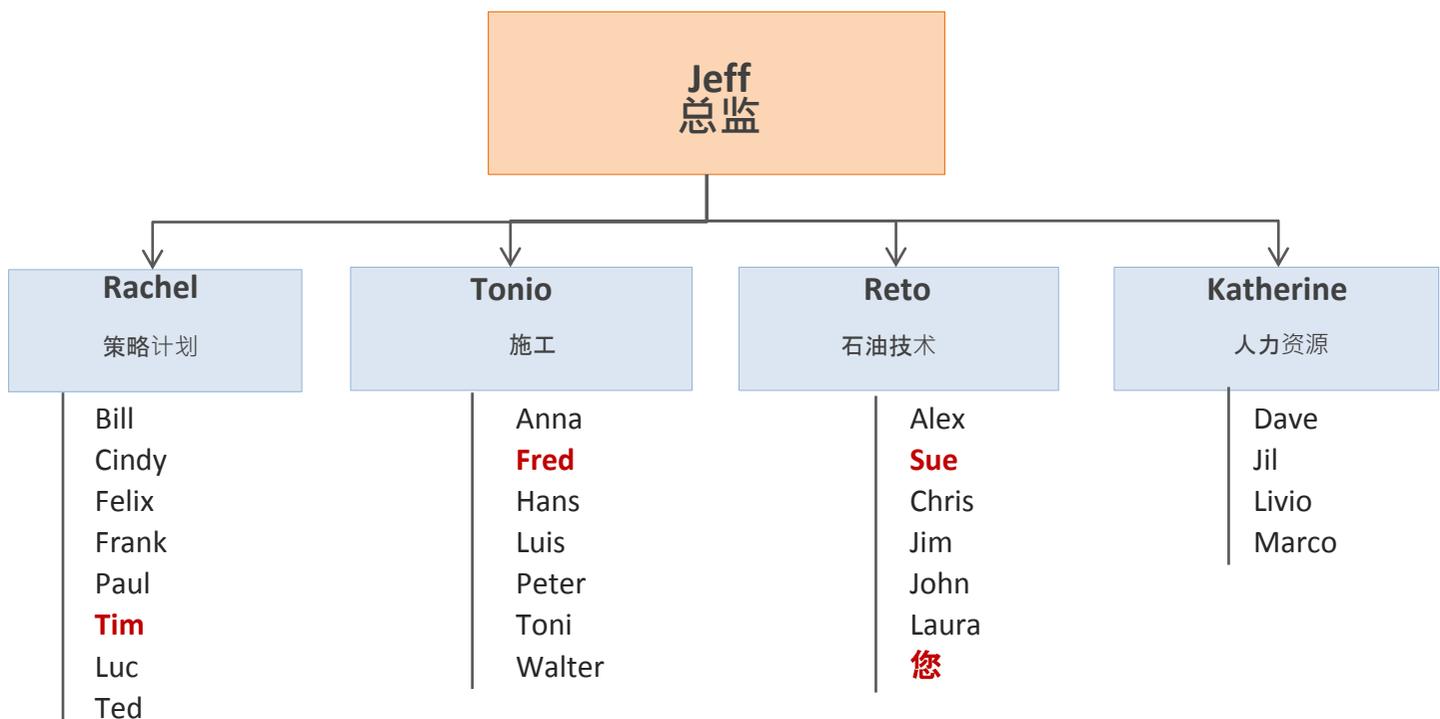

项目任务	员工人数	预计所需时间 (日)	基于之前的任 务/工作/活动	技能要求				
				石油技术	施工	金融	采购	人力资源
1 规格列表	2	5	—	3	2		3	
2 网站要求	1	7	1	2	5		2	
3 招标	2	10	1	3	1		4	2
4 预算批准	2	12	1	1	2	5		
5 合同谈判	2	8	3, 4	3	3	4		2
6 签署合同	2	13	2, 5			5	4	
7 项目专长	4	15	5	3	2	2		
8 通信计划	3	14	5	3		2		2
9 附加设备	3	5	4	5	2		1	
10 安装计划	1	10	6, 9	3	2			2
11 员工计划	2	11	1	1		2		5
12 操作文档	3	6	5	5	2			2
13 员工招聘/培训	4	11	11	4	2			5
14 风险管理计划	1	5	7, 12, 13	5	2	3		3
15 整合计划	3	3	8, 10, 14	3		1	2	
16 文档	1	22	2	3	1		2	
17 生产计划批准	4	2	15, 16	2		4	3	

资源	时薪	是否有空档/ 时间来做什么 项目	从第。。。周 有时间/可上 岗	技能				
				石油技术	施工	金融	采购	人力资源
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

活动网络

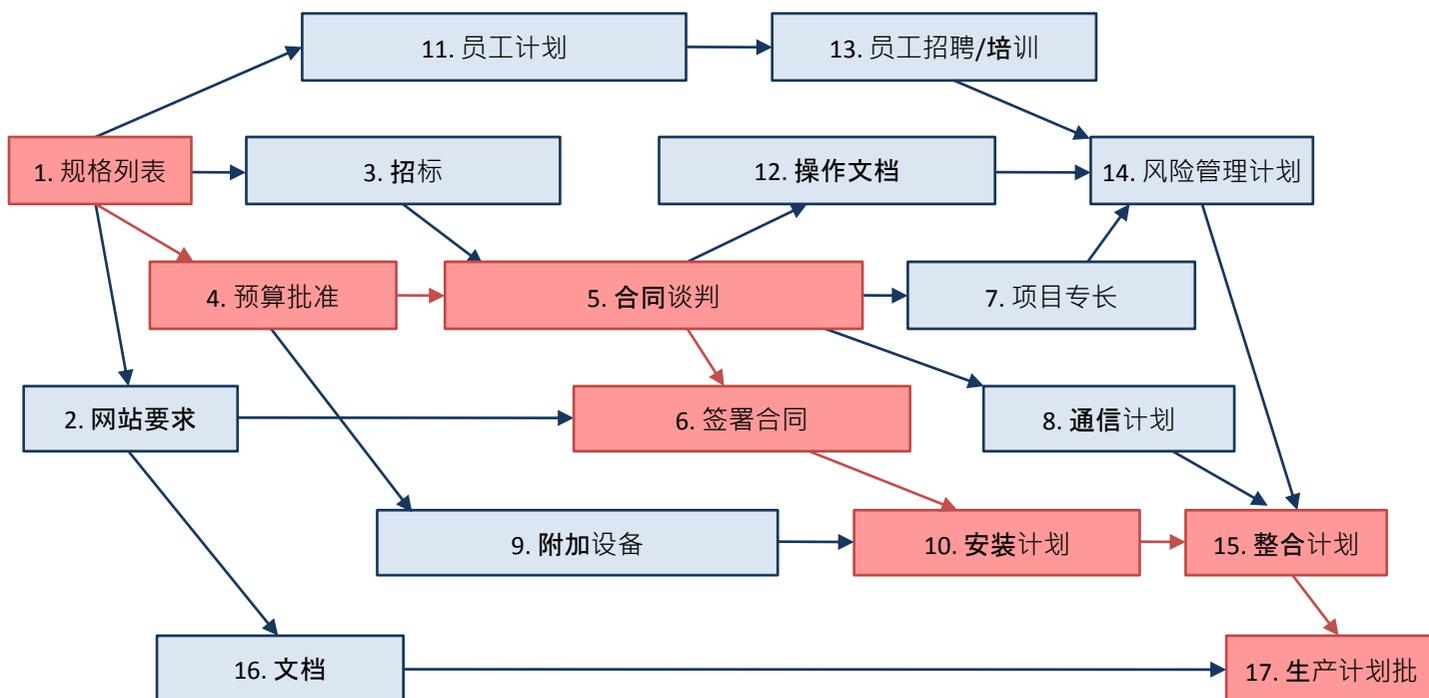

甘特图表

